MarkeTOB

Локальный пилот
Контрольная точка G01

PM-001–004 завершены в зафиксированном объёме
21 октября 2026

Результаты первых четырёх задач

Задача	Результат	Граница готовности
PM-001	30 требований, 16 историй	Требования и цели проверки
PM-002	Web-стек и архитектура	Android проверим позже
PM-003	Интерактивный UX	Демонстрационные данные
PM-004	64 схемы, 44 операции	Спецификация API

Продуктовый backend, Docker-образ и APK ещё предстоит создать.

Каталог и статус заявки


Пользователь сохраняет канал и отправляет заявку боту.

Request sent показывает очередь.


Confirmed появляется после результата бота.


View request открывает существующую заявку.

Макет с demo-данными

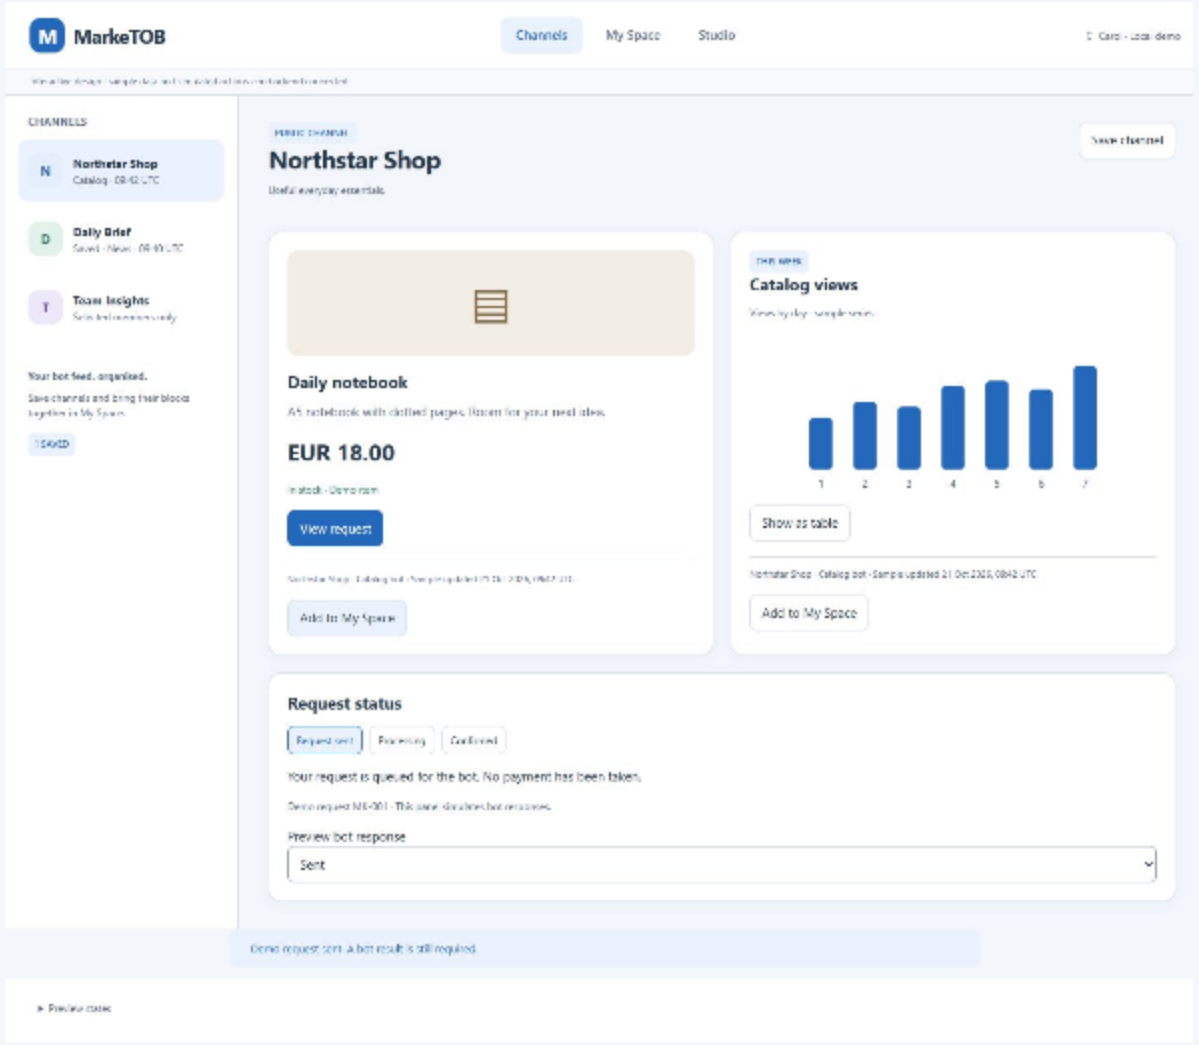

Мобильная навигация и закрытый источник

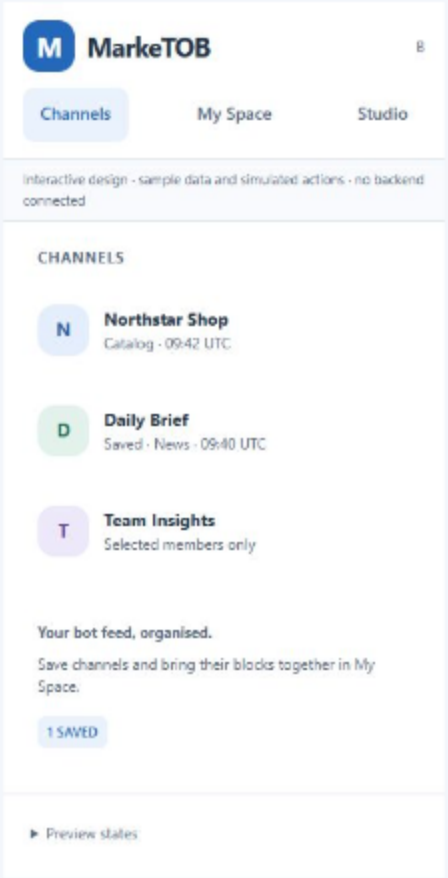




На телефоне список каналов и содержимое открываются последовательно.

Закрытый источник показывает Access required без новостных данных.

Виджет пока представлен HTML-макетом. APK и USB-проверка отложены.

Система: готовность компонентов

Готово: контракт Частично: клиентский прототип Не сделано: runtime

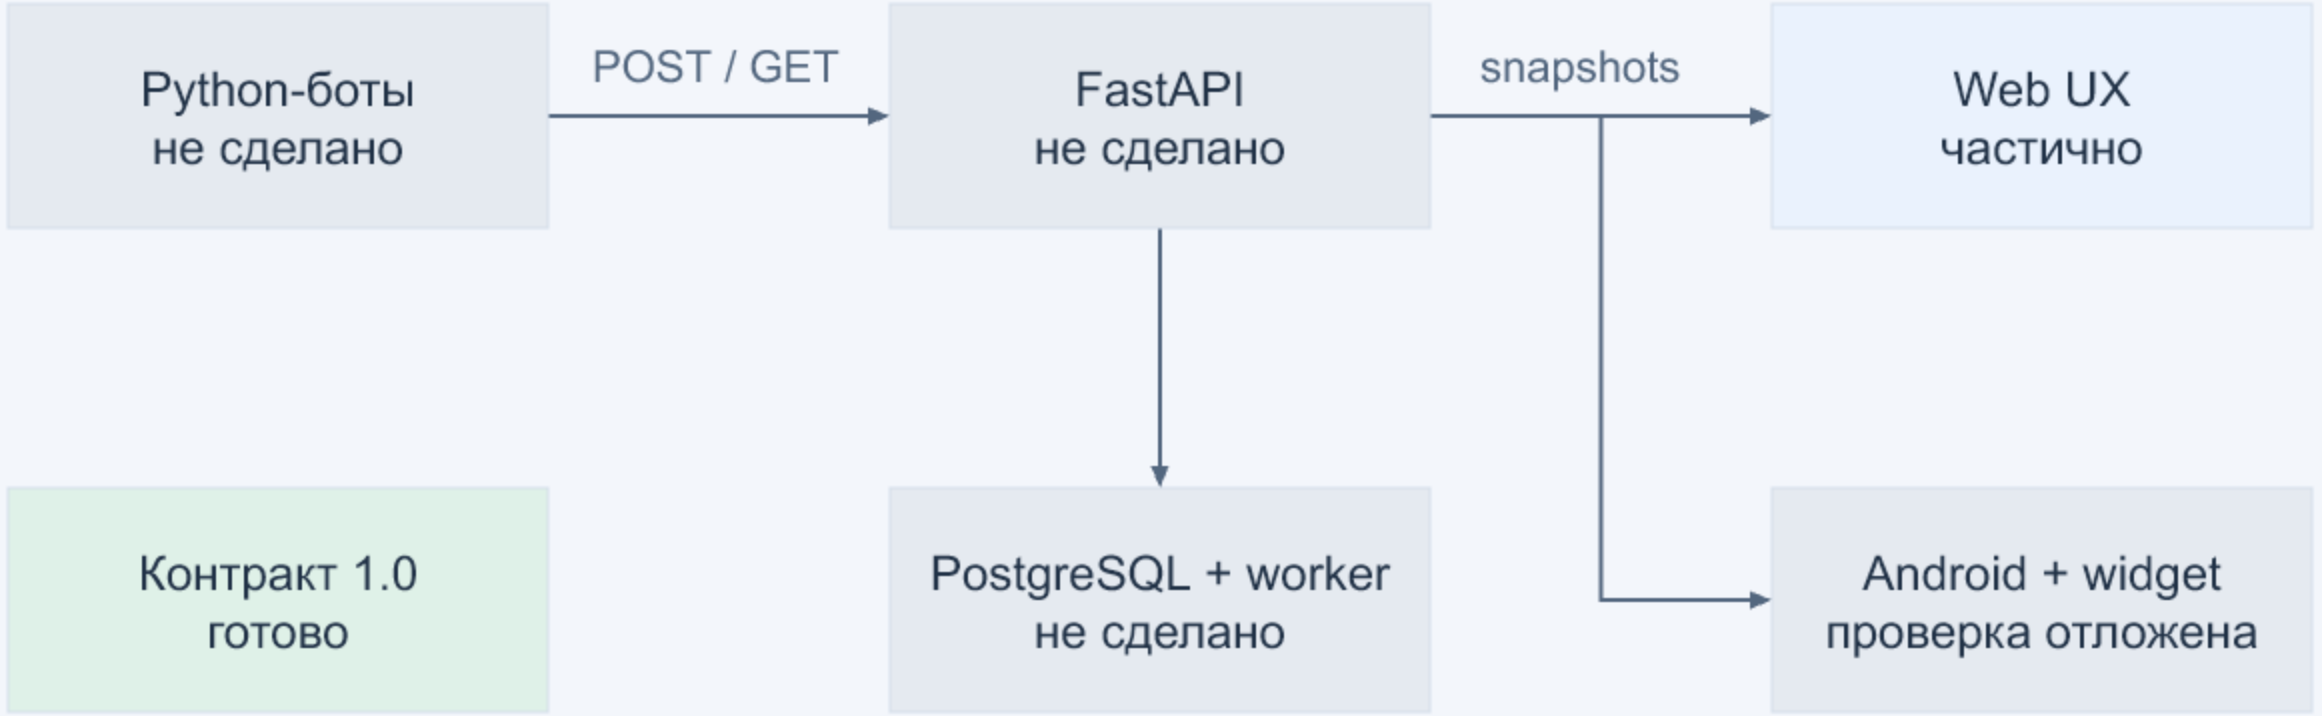

Боты общаются через API. Доступ к таблицам БД им не предоставляется.

Жизненный цикл действия

1

Запись заявки

Сервер проверяет права, наличие товара и его revision.
Повтор с тем же ключом возвращает существующую заявку.

2

GET и ACK

GET допускает повторную доставку. Бот сохраняет событие
и подтверждает получение отдельным ACK.

3

Результат бота

Processing, Confirmed или Failed меняют бизнес-статус.
Неопределённый результат требует сверки, без новой покупки.

Код, компоненты и сущности

Файл / компонент	Что делает	Сущности
prototype.js	Переходы экранов в памяти	Channel, Block, My Space
build_contract.py	Генерирует OpenAPI и схемы	Message, Layout, Result
reference_model.py	Проверяет сценарии доставки	Request, Event, ACK
Identity / Registry	Следующий этап реализации	User, Session, Bot, Key
Pages / Sharing	Права и ссылки на источники	Channel, Grant, Template

Python используется для контракта, проверок и будущего backend.

Проверки и оставшиеся риски

Проверено

25 контрактных тестов прошли.

12 цветовых пар прошли проверку.

Desktop и mobile UX пройдены.

Web-spike открывается offline.

Проверить при реализации

SQL-транзакции и реальные права.

Падение API/worker и восстановление.

APK, устройство и домашний виджет.

Нагрузка 1 000 сообщений/мин.

Цели производительности ещё не измерены. Google и облачный push отложены.

Следующий этап: основа backend

Порядок	Задача	Зачем сейчас
PM-005	Окружение и CI	Воспроизводимый запуск и проверки
PM-006	Локальные сессии и права	Отделить пользователей и источники
PM-007	Боты и индивидуальные ключи	Разрешить безопасное подключение
PM-008	Приём и хранение сообщений	Получить первые реальные snapshots

До PM-005 нужны ответы на вопросы G01.
После PM-008 проведём следующую презентацию.
